

A) TECHNICKÁ ZPRÁVA - DIO

1. Identifikační údaje

1.1. Základní údaje stavby

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Název stavby: | Štěnovice,PJ,parc.č.59/1-NN |
| Číslo komunikace: | - |
| Správce komunikace: | Štěnovice |
| Katastrální území: | Štěnovice |
| Kraj: | Plzeňský kraj |

1.2. Základní údaje projektanta

| | |
|-------------|------------------------------|
| Projektant: | J. Horáková |
| | Kaja engineering s.r.o. |
| | IČ:08865752 |
| | DIČ:CZ08865752 |
| | Na Úhoru 413/1 |
| | 318 00 Plzeň |
| | Tel: +420 774 194 941 |
| | horakova@kaja-engineering.cz |

Stupeň

PD

Základní údaje

Na p.č. 1110, z vedení AlFe 4x70 provést svod kabelem AYKY 3x120+70 po bodě č. 54, u č. p. 237 do rozpojovací skříně typu SV101 osazené na tomto bodě. Z této skříně pokračovat přes komunikaci, p.č. 1110 do nově vybudované kabelové skříně typu SS100/X141 postavené u opěrné zdi u hranice parc. č. 59/1. Kabel bude uložen do výkopu 35x80cm v pískovém loži. Přejít komunikace bude proveden protlakem a kabel bude uložen do ochranné trubky (kroug. PE koruflex 110/94 ohebná). Pilíř SS100/X141 bude veřejně přístupný z p.č.1110 včetně otevírání do tohoto pozemku.


Dopravně inženýrská opatření

Práce probíhají protlakem asf. komunikace a dlážděného chodníku. Během provádění prací dojde k dopravnímu omezení komunikace a uzavření chodníku v ul. Štěnovická na pozemcích p.č. 1110 k.ú. Štěnovice. Na komunikaci bude ve vzdálenosti cca 30 m před pracovním místem umístěna značka A15 s výstražným světlem typ 1. Výstražné světlo typ 1 lze nahradit fluorescenčním podkladem značky. Před pracovní plochou bude v místech chodníku umístěna zábrana Z2 a dopravní značka B30 zákaz vstupu chodců s dodatkovou tabulkou „MIMO VOZIDEL STAVBY“. Na protější straně realizovaného protlaku bude pracovní místo vymezeno zábranami Z4a, v místě přístupu na pozemek parc. č. 77 je nutné zajistit dostatečný prostor obsluze nemovitosti. Během provádění prací je nutné zajistit min. průjezdnost komunikace 5,5m

Dopravní značky budou v reflexním provedení, za údržbu zodpovídá zhotovitel stavby. Po skončení stavebních prací bude dopravní značení odstraněno. Před započítím stavebních prací bude dopravní opatření projednáno s Policií ČR, příslušném DI, o uzavírku bude zažádáno na příslušný odbor dopravy.

Při provádění stavebních prací je nutno umožnit příjezd Policii ČR, hasičskému záchrannému sboru a záchranné službě.

C) SITUACE DIO
Štěnovice, PJ, parc.č.59/1-NN
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

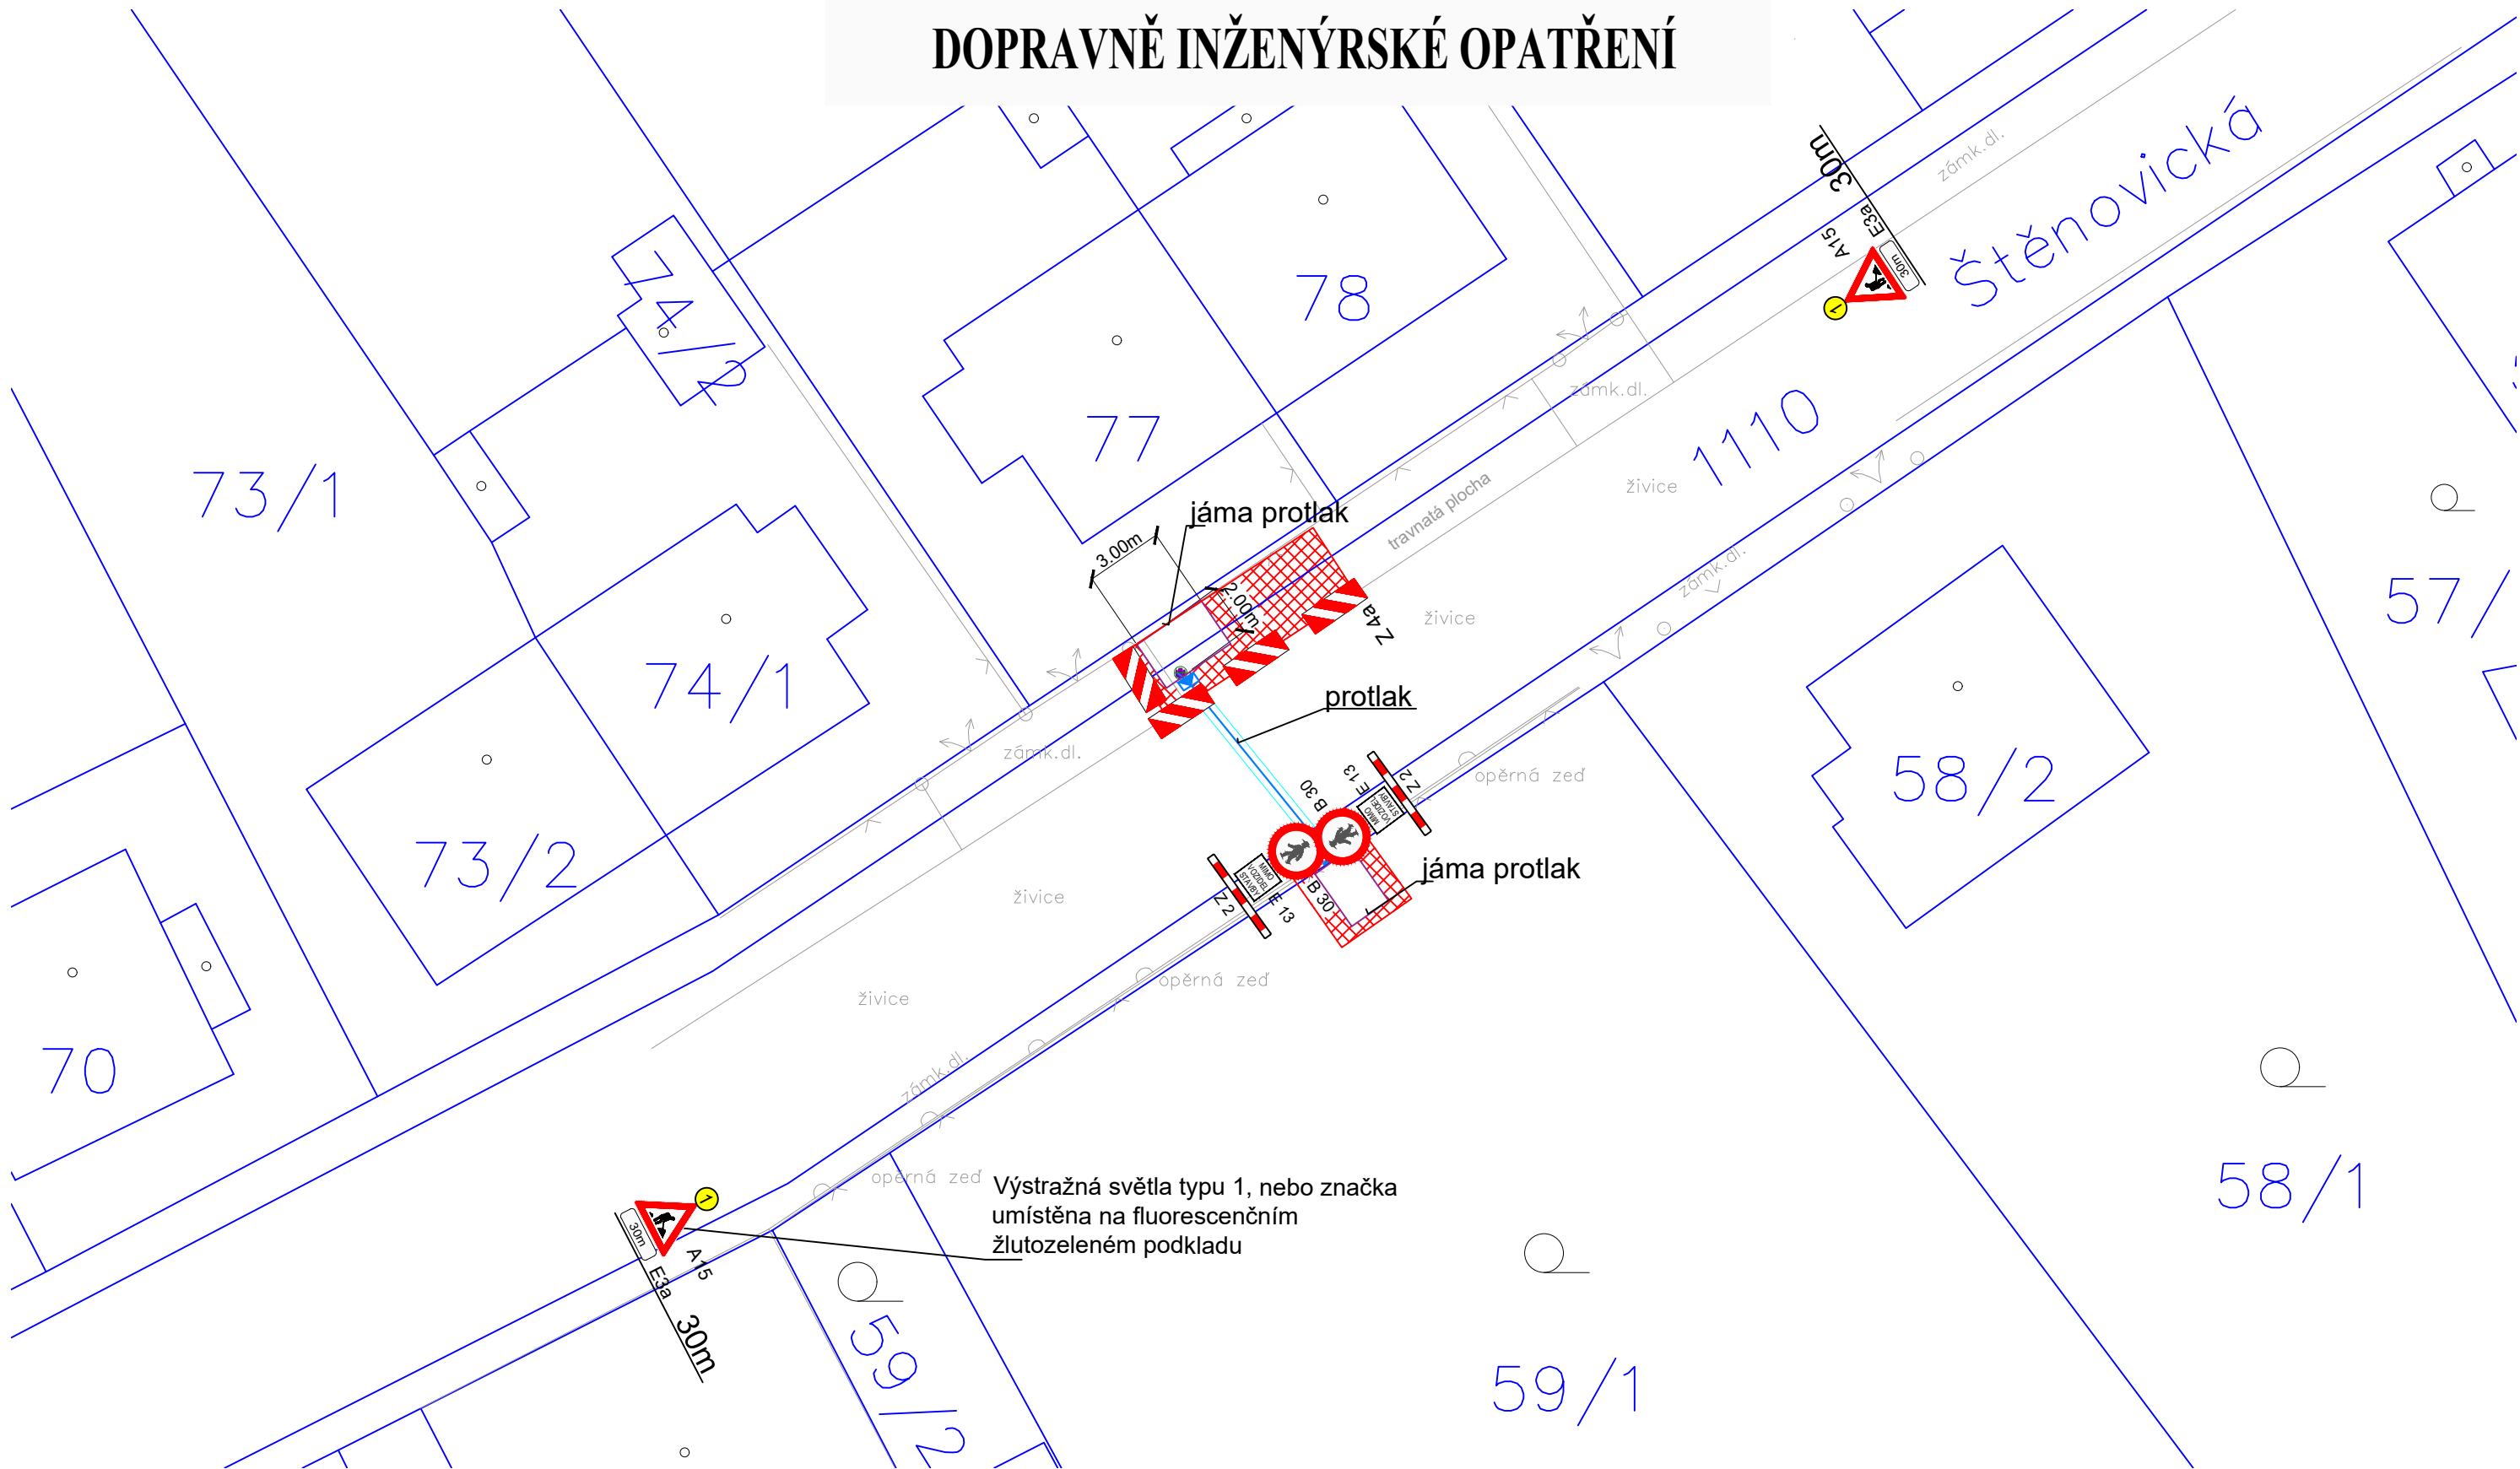

Výstražná světla typu 1, nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu

D) VÝPIS DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Štěnovice,PJ,parc.č.59/1-NN

| popis dopravní značky | počet kusů |
|----------------------------------------------|-------------------|
| A15 - Práce na silnici | 2 |
| Výstražné světlo typ 1 | 2 |
| B30 – Zákaz vstupu chodců | 2 |
| E13 - Text nebo symbol "MIMO VOZIDEL STAVBY" | 2 |
| Z2 - Zábrana pro označení uzavírky | 2 |
| E3a - Vzdálenost "30 m" | 2 |
| Z4a – Vodící deska | 4 |

B) PŘEHLEDNÁ SITUACE

Štěnovice, PJ, parc.č.59/1-NN

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

